



Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle

Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle

Rivierweg-Meeuwensingel

GEREED: Alle werkzaamheden zijn afgerond uitgezonderd het onttrekken van de brug ter hoogte van de Pluvier-sstraat. De procedure hiervoor is in afwachting van indiening en goedkeuring door het Denk en Doemeefonds voor verplaatsing naar de Torenhof.

Gemeentetuin

EERSTE FASE GEREED: De werkzaamheden voor de inrichting van de eerste fase van de gemeentetuin zijn afge-rond.

De tweede fase van de gemeentetuin wordt afgerond gelijk met inrichting van het Stadsplein, gepland in 2022-2023.

Reigerlaan-Kerklaan-Fluiterlaan

GEREED: Alle werkzaamheden zijn afgerond inclusief het groen. De bomen en beplanting zijn aangebracht.



Kerklaan [entree fietsenstalling/ Koperwiek]

Rivierweg midden

Dec. 20 - Juni 21: De uitvoering is in volle gang. De herinrichting van de Rivierweg - midden en de parkeerplaats worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast tot een minimum te beperken. De werkzaamheden zijn momenteel halverwege. De bomen en vaste planten worden in het plantseizoen 2021-2022 aangebracht.

Stadsplein

Januari 20 - juni 21: Het ontwerp van het Stadsplein is eind 2020 met de raad gedeeld. In 2021 wordt het ontwerp aan de Capellenaren gepresenteerd. Momenteel wordt het ontwerp uitgewerkt tot definitief ontwerp. De uitvoering wordt afgestemd op de werkzaamheden van RET en Wereldhave aan de Koperwiek.

Alkenlaan-Pelikaanweg

EERSTE FASE GEREED: De werkzaamheden voor de inrichting van de eerste fase zijn gereed.



De inrichting van tweede fase wordt uitgevoerd als de bouwwerkzaamheden op de scholenlocatie en de Post NL locatie gereed zijn.



Alkenlaan [parkeerterrein Aquapelle]

Planning gebiedsvisie grafisch weergegeven

Onderstaand treft u een weergave aan van de (beoogde) planning van de start van de uitvoering werkzaamheden aan de Centrumring en de werkzaamheden welke momenteel in uitvoering zijn.

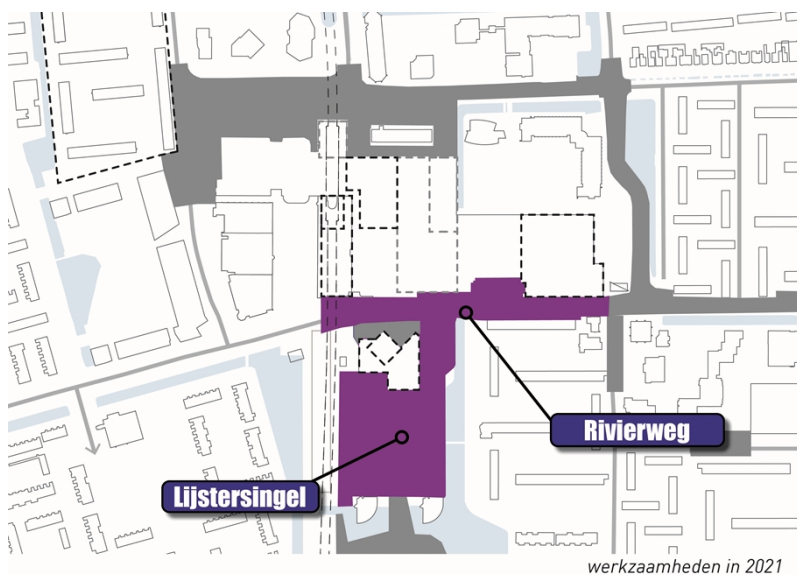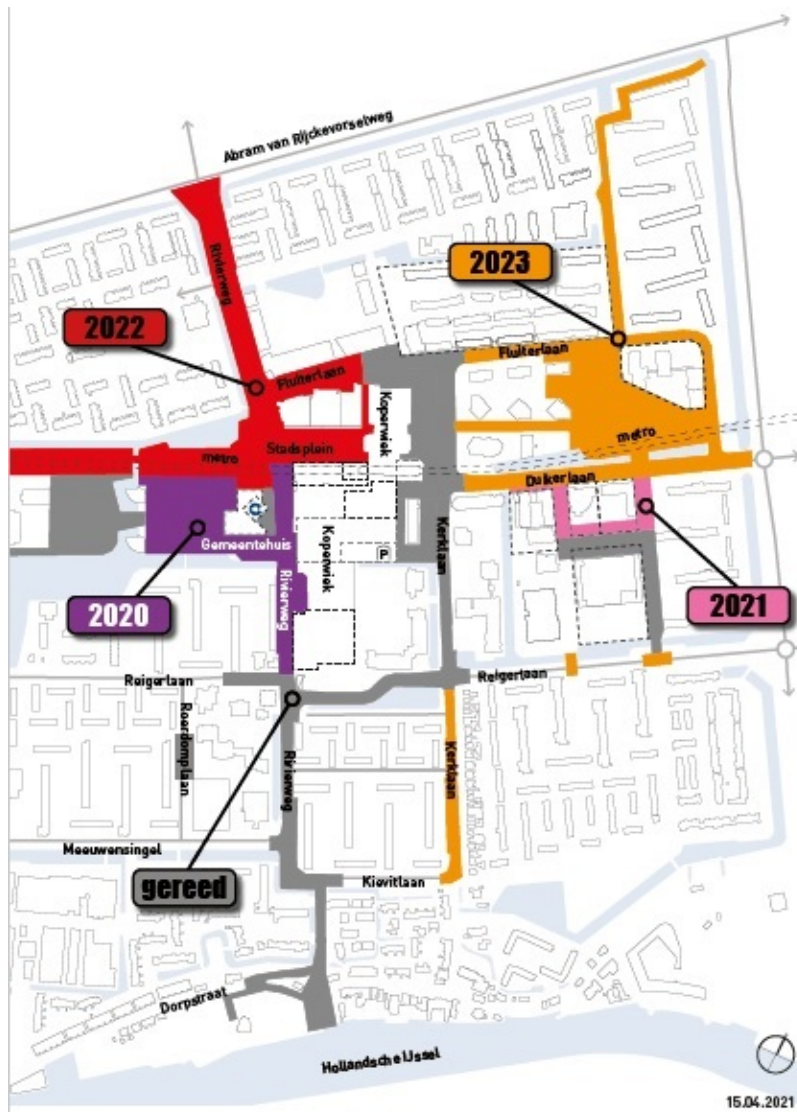

Prognose per jaarschijf

Prognose per jaarschijf	Investeringskosten	Krediet			Budget		
		Begroot	Werkelijk & Prognose	Saldo	Begroot	Werkelijk & Prognose	Saldo
Totaal uitgaven 2017 - Fase 1	2.359	1.644	1.645	0	715	801	-86
Totaal inkomsten 2017 - Fase 1	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 2017 - Fase 1	2.359	1.644	1.645	0	715	801	-86
Totaal uitgaven 2018 - Fase 2	2.685	2.055	2.216	-162	630	528	102
Totaal inkomsten 2018 - Fase 2	-446	-446	-446	0	0	0	0
Totaal 2018 - Fase 2	2.239	1.609	1.770	-162	630	528	102
Herinrichting parkeerterreinen AH	1.151	907	2.333	101	244	757	-121
Herinrichting Kerklaan Noord / Fluiterslaan West	1.720	1.327			392		
Herinrichting pp Gemeentehuis (LIJSTERSINGEL)	200	200			0		
Totaal uitgaven 2019 - Fase 3	3.071	2.434	2.333	101	636	757	-121
Totaal inkomsten 2019 - Fase 3	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 2019 - Fase 3	3.071	2.434	2.333	101	636	757	-121
Herinrichting Alkenlaan/Pelikaanweg (fase 1)	804	631	3.546	0	172	660	106
Herinrichting Rivierweg Midden (ZUID)	1.298	1.077			221		
Herinrichting pp Gemeentehuis (PARKEERPLAATS)	2.210	1.838			373		
Totaal uitgaven 2020 - Fase 4	4.312	3.546	3.546	0	766	660	106
Totaal inkomsten 2020 - Fase 4	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 2020 - Fase 4	4.312	3.546	3.546	0	766	660	106
Herinrichten Stadsplein	504	0	0	0	504	1.360	0
Herinrichting Alkenlaan/Pelikaanweg (fase 2)	200	200	200	0	0		
Herinrichting Rivierweg Midden (NOORD)	1.235	1.028	1.028	0	207		
Herinrichting Fluiterslaan West / Rivierweg Noord **** excl 970K ****	949	471	471	0	478		
Herinrichting Amandelpark	172	0	0	0	172		
Totaal uitgaven 2021 - Fase 5	3.059	1.699	1.699	0	1.360	1.360	0
Totaal inkomsten 2021 - Fase 5	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 2022 - Fase 5	3.059	1.699	1.699	0	1.360	1.360	0
Herinrichten Duikerlaan	1.281	980	980	0	301	739	0
Herinrichten Fluiterslaan Oost	1.017	762	762	0	256		
Herinrichten Kerklaan Zuid	776	627	627	0	150		
Logische verbinding fietsverbinding Wiekslag	189	156	156	0	32		
Totaal uitgaven 2022 - Fase 6	3.263	2.524	2.524	0	739	739	0
Totaal inkomsten 2022 - Fase 6	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 2023 - Fase 6	3.263	2.524	2.524	0	739	739	0
TOTAAL OR CENTRUMGEBIED							
Totaal uitgaven	18.750	13.903	13.963	-61	4.846	4.845	1
Totaal inkomsten	-446	-446	-446	0	0	0	0
Totaal	18.304	13.457	13.517	-61	4.846	4.845	1
